



Ing. Leticia Rascón Córdova.  
Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública.  
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

03 SEP. 2025  
RECIBIDO

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0808/2025 de fecha 21 de agosto del 2025, se me comisiona para que, realice la verificación física de las obras anexas a dicho oficio correspondientes a los programas "FAMIEB CONSOLIDACIONES" "FAMIEB 2025" y "RECURSOS PROPIOS FINANCIAMIENTO, que se encuentran ubicadas en los municipios de Cajeme y Guaymas del estado de Sonora.



A continuación, se hace un desglose de las actividades realizadas:

El día 27 de agosto del 2025, se realizó el traslado a la localidad de Torim, municipio de Guaymas, para la Verificación física a la siguiente obra:

**Nombre de la Obra:** "(25-CFB-017) CONSTRUCCION DE UN AULA, EN TELESECUNDARIA 287, EN LA LOCALIDAD DE TORIM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA."

**No. De Contrato:** ISIE-FAMIEB-25-010

**Ejecutora:** Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

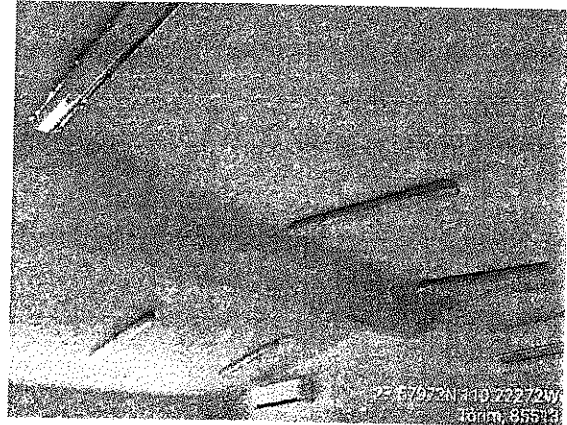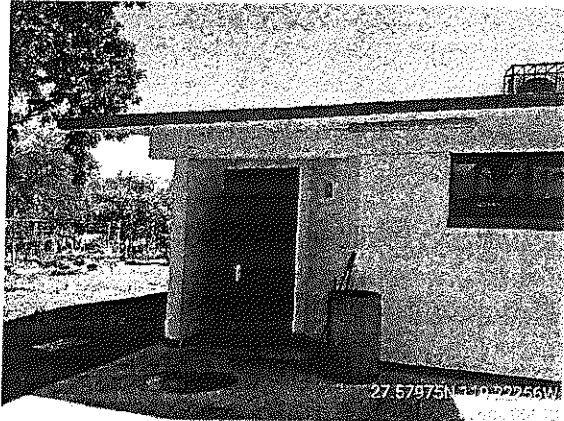


Se realizó el traslado a la localidad de Morelos uno, municipio de Cajeme, para la Verificación física a la siguiente obra:

**Nombre de la Obra:** "(25-ED-0019) REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD MORELOS 1, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA."

**No. De Contrato:** ISIE-ED-25-012

**Ejecutora:** Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

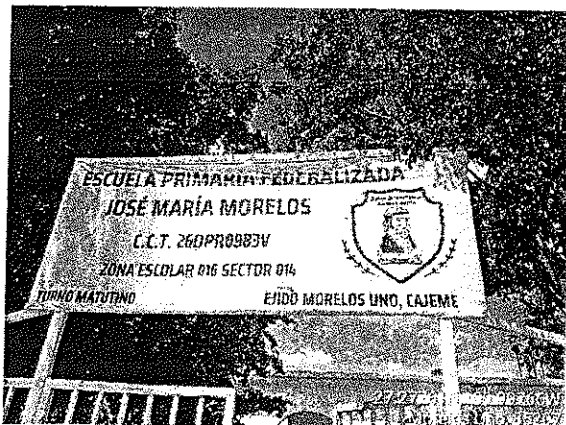


El día 28 de agosto del 2025, se realizó el traslado a la localidad de Providencia, municipio de Cajeme, para la Verificación física a la siguiente obra:

**Nombre de la Obra:** "(25-RAR-002) CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA."

**No. De Contrato:** ISIE-FAMIEB-25-040

**Ejecutora:** Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

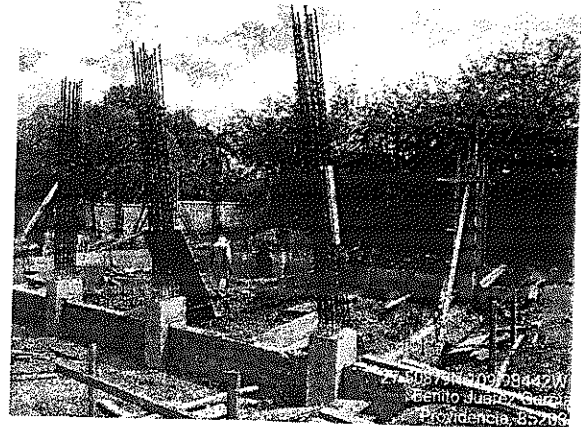


El día 29 de agosto del 2025, se continuó en a la localidad de Providencia, municipio de Cajeme, para la verificación física a la siguiente obra:

**Nombre de la Obra:** "(25-RAR-003) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA."

**No. De Contrato:** ISIE-ED-25-042

**Ejecutora:** Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

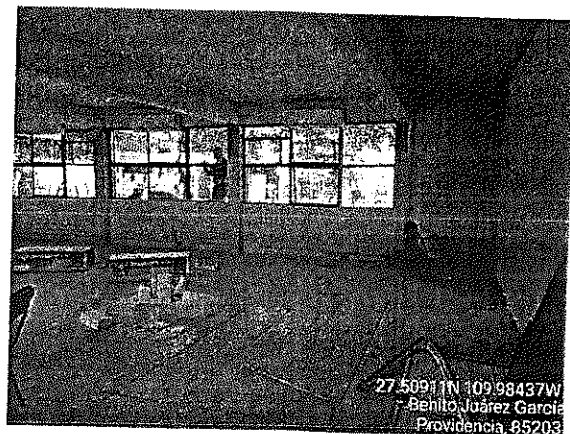


8

**Conclusión:**

El día 29 de agosto del presente año, habiéndose concluido las actividades de verificación física, se realizó traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora.  
Se anexa copia de oficio de comisión.

**ATENTAMENTE**



**Ing. Diego Alberto Vazquez Montijo**  
**Auditor Encargado**



GOBIERNO  
DE SONORA

**BUEN  
GOBIERNO**



**Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública.**  
**Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.**  
**Oficio: ECOP-DV-0808/2025.**  
Hermosillo, Sonora a 21 de agosto de 2025.  
"2025: Año de la inclusión de las personas con discapacidad".

Asunto: Se comisiona

**ING. DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO**  
Auditor Encargado.  
Presente.


Con fundamento en el Artículo 18, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes recursos "FAMIEB CONSOLIDACIONES", "FAMIEB 2025" y Recursos Propios (Financiamiento), las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Cajeme y Guaymas, Sonora.

Dicha comisión comprende del 27 al 29 de agosto del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 días de viáticos y 1 día de gasto de camino con cargo a los recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Pick Up Chevrolet S10 con número de placas UY-4462-A, recorriendo 700 km de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 27 de agosto a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

  
**ING. LETICIA PASCÓN CÓRDOVA.**  
Directora General.

C.c.p. Lic. Carmen Elena Blanco Mézquita. Directora General de Administración y Control Presupuestal de la S.A.B.G. Presente  
Lic. Angela Beatriz Beltrán Figueroa. Directora de Recursos Financieros y Materiales. Presente  
C.P. Gabriela Campa Cañez. Subdirectora de Recursos Humanos. Presente  
Archivo  
RGF/LMN



**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

Dirección General de Evaluación  
y Control de Obra Pública

SEC  
  
ESCUELA  
TELESECUNDARIA  
No. 287  
C.T. 26ETVD287 W  
TORIM, GUAYMAS, SON.  
ZONA ESC. No. 906

No. Centro:	
Gasolina:	2,500
Casetas:	310
Otros:	
Total:	\$2,810
Kilometraje	
Inicial:	45,028 km
Entrega:	45,677 km
Diferencia:	649 km

**ANEXO A OFICIO No. ECOP-DV-808/2025**

DIAS DE VERIFICACION	OBRA	CONTRATO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA
27 al 29 de agosto 2025	(25-ED-0019) REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR, EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD MORELOS 1, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	ISIE-ED-25-012	CAJEME	MORELOS 1	RECURSO ESTATAL / FINANCIAMIENTO
	(25-CFB-017) CONSTRUCCION DE UN AULA, EN TELESECUNDARIA 287, EN LA LOCALIDAD DE TORIM, EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA.	ISIE-FAMIEB-25-010	GUAYMAS	TORIM	RECURSO ESTATAL / FAMIEB CONSOLIDACIONES
	(25-RAR-002) CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIOS, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	ISIE-FAMIEB-25-040	CAJEME	PROVIDENCIA	FAMIEB 2025
	(25-RAR-003) REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN SECUNDARIA TECNICA 53 MARIA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA, EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.	ISIE-FAMIEB-25-042	CAJEME	PROVIDENCIA	FAMIEB 2025





GOBIERNO  
DE SONORA

**BUEN  
GOBIERNO**



**SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS**

<b>FECHA:</b> 21 de agosto de 2025.		<b>CLAVES PRESUPUESTARIAS:</b> 1060000900 1304E103O02133A1 375011 2511EM1300 1060000900 1304E103O02133A1 375021 2511EM1300	
<b>ADSCRIPCIÓN:</b> Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno			
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
<b>UNIDAD EJECUTORA:</b> 1304E103O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
<b>NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO:</b> Ing. Diego Alberto Vazquez Montijo			
<b>NIVEL:</b> 7B			
<b>No. DE EMPLEADO:</b> 47419			
<b>PUESTO FUNCIONAL:</b> Auditor Encargado			
<b>DESTINO:</b> Cajeme y Guaymas, Sonora.			
<b>MOTIVO:</b> Se le comisiona para que realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondientes recursos "FAMIEB CONSOLIDACIONES", "FAMIEB 2025" y Recursos Propios (Financiamiento), las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Cajeme y Guaymas, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-0808/2025.			
<b>PERIODO DE LA COMISIÓN:</b> 27 al 29 de agosto 2025.		<b>POR INSTRUCCIONES DE:</b> Ing. Leticia Rescón Córdova, Directora General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
<b>NÚMERO DE DÍAS</b>	<b>COSTO POR DÍA</b>	<b>TOTAL, POR DÍA</b>	
<b>VIÁTIO:</b> 2 días	\$ 700.00	\$ 1,400.00	
<b>GASTO DE CAMINO:</b> 1 día	\$ 300.00	\$ 300.00	
<b>SUMA TOTAL:</b>		\$ 1,700.00	
<b>OBSERVACIONES:</b> Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.			
<b>RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE:</b> \$ 1,700.00 (Son: Mil setecientos pesos 00/100 M.N.)			
<b>SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO</b>  <b>ING. DIEGO ALBERTO VAZQUEZ MONTIJO.</b> RFC VAMD861113J23	<b>SOLICITA - RECIBE</b>  <b>LIC. CARMEN ELENA BLANCO MÉZQUITA.</b> DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL.	<b>AUTORIZA</b>  <b>ING. LETICIA RESCÓN CORDOVA.</b> DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.	
