



MUNICIPIO DE
SAN IGNACIO RIO, MTO. SON.
DESARROLLO ECONÓMICO
Y SOCIAL.



GOBIERNO
DE SONORA

CONTRALORÍA
GENERAL

Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública

Secretaría de la Contraloría General

Oficio: ECOP-DV-0145/2023.

Hermosillo, Sonora a 27 de enero del 2023.

"2023: Año de Adolfo de la Huerta"

Asunto: Se comisiona

ING. ANACLETO IGNACIO TERRONES VILLASANA.

Auditor Supervisor.

Presente.

Con fundamento en el Artículo 17, fracción I del Reglamento Interior de esta Secretaría, se le comisiona para que, realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondiente al Programa, "FISE", las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Guaymas, Empalme, Quiriego, San Ignacio Río Muerto y Benito Juárez, Sonora.

Dicha comisión comprende del 01 al 03 de febrero del año en curso, para lo cual dispondrá de 2 días de viáticos y 1 día de gastos de camino con cargo a los recursos del 2 al millar estatal, debiendo rendir un informe escrito con las conclusiones respectivas.

El recorrido se realizará en el vehículo Toyota Hilux con número de placas VB-71-399 recorriendo 800 kms de carretera pavimentada, cruzando 4 casetas de peaje, por lo que deberá coordinarse con el área respectiva para que el vehículo se le proporcione el día 01 de febrero a partir de las 7:00 horas, entregándolo al término de la comisión, de acuerdo a las instrucciones giradas por esta unidad.

Agradeciendo su atención, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente


ING. VÍCTOR ERRAÍN FIGUEROA MIRANDA.
Director General.

C.c.p. Lic. David López Huguez. Director General de Administración y Control Presupuestal de la S.C.G. Presente
Lic. Angela Beatriz Beltrán Figueroa. Director de Recursos Financieros y Materiales
Archivo
RGF/LMN/GVB

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo Nivel, Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280, Hermosillo,
Sonora, Teléfono (662) 217 1885, (662) 217 2517.

www.sonora.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRAS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
HERMOSILLO, SONORA.





GOBIERNO
DE SONORA
SECRETARÍA DE
CONTRALORÍA
GENERAL

SOLICITUD DE GASTOS DE VIÁTICOS

FECHA: 27 de enero del 2023		CLAVES PRESUPUESTARIAS: 1060000900 1304E103O02133A1 375011 2311EM1300 1060000900 1304E103O02133A1 375021 2311EM1300	
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de la Contraloría General			
UNIDAD RESPONSABLE: 1060000900 Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública			
UNIDAD EJECUTORA: 1304E103O02133A1 FISCAL.CTRL.EVAL.GEST.P			
NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO: Ing. Anacleto Ignacio Terrones Villasana			
NIVEL: 8B			
No. DE EMPLEADO: 37116			
PUESTO FUNCIONAL: Auditor Supervisor			
DESTINO: Guaymas, Empalme, Quiriego, San Ignacio Río Muerto y Benito Juárez, Sonora.			
MOTIVO: Se le comisiona para que, realice la verificación física de las obras anexas a este oficio, correspondiente al Programa, "FISE", las obras se encuentran ubicadas en los municipios de Guaymas, Empalme, Quiriego, San Ignacio Río Muerto y Benito Juárez, Sonora. Según oficio de comisión No. ECOP-DV-0145/2023.			
PERIODO DE LA COMISIÓN: 01 al 03 de febrero del 2023		POR INSTRUCCIONES DE: Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda. Director General de Evaluación y Control de Obra Pública.	
NÚMERO DE DÍAS	COSTO POR DÍA	TOTAL, POR DÍA	
Viáticos: 2 días	\$700.00	\$1,400.00	
Gastos de Camino: 1 día	\$300.00	\$300.00	
SUMA TOTAL:		\$1,700.00	
OBSERVACIONES: Con cargo a los recursos del 2 al millar estatal.			
RECIBÍ DE LA CAJA DE GOBIERNO LA CANTIDAD DE: \$1,700.00 (mil setecientos pesos 00/100 M/N)			
SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO ING. ANACLETO IGNACIO TERRONES VILLASANA RFC TEVA610713DV9	SOLICITA - RECIBE LIC. DAVID LOPEZ HUGUEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	AUTORIZA ING. VÍCTOR EFRAÍN FIGUEROA MIRANDA DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.	

ANEXO AL OFICIO ECOFIDEV-015/2023					
DIAS DE VERIFICACION	OBRA	CONTRATO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	PROGRAMA
01 AL 03 DE FEBRERO	C-00085/0370 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, MPIO. DE GUAYMAS.	SEDESSON-FISE-2022-037	GUAYMAS EMPALME	VARIAS	FISE
	C-00085/0373 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA ATRAVEZADA), MPIO. DE EMPALME.				
	C-00085/0374 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MPIO. DE EMPALME.				
	C-00085/0375 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ÚRSULO GALVÁN, MPIO. DE EMPALME.				
	C-00085/0376 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL PALMAR, EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MPIO. DE EMPALME.	SEDESSON-FISE-2022-024	QUIRIGO SAN IGNACIO RIO MUERTO BENITO JUAREZ	VARIAS	FISE
	C-00075/0754 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. DE QUIRIGO.				
	C-00075/0755 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. DE SAN IGNACIO RIO MUERTO				
	C-00075/0756 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. DE BENITO JUÁREZ				

R

Ing. Víctor Efraín Figueroa Miranda
Director General de Evaluación de Obra Publica

En cumplimiento a lo dispuesto en el oficio de comisión No. ECOP-DV-0145/2023, de fecha 27 de enero del 2023, se me comisiona para que efectúe la verificación física de las obras anexa a este oficio:

El día 01 de febrero del 2023, se realizó el traslado a la localidad de Profesor Graciano Sánchez municipio de Guaymas, realizándose verificación de la siguiente obra:

OBRA: "CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE GUAYMAS"


EJECUTORA: SEDESSON

PROGRAMA DE INVERSIÓN: "FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)"

CONTRATO NO.: SEDESSON-FISE-2022-037 (C-00085/0370)



TANQUE DE ALAMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 15 000 LITROS DE CAPACIDAD, EL CUAL SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN DANDO SERVICIO A LA COMUNIDAD, TAMBIEN SE APRECIA TANQUE ANTERIOR QUE NO HA SIDO RETIRADO.

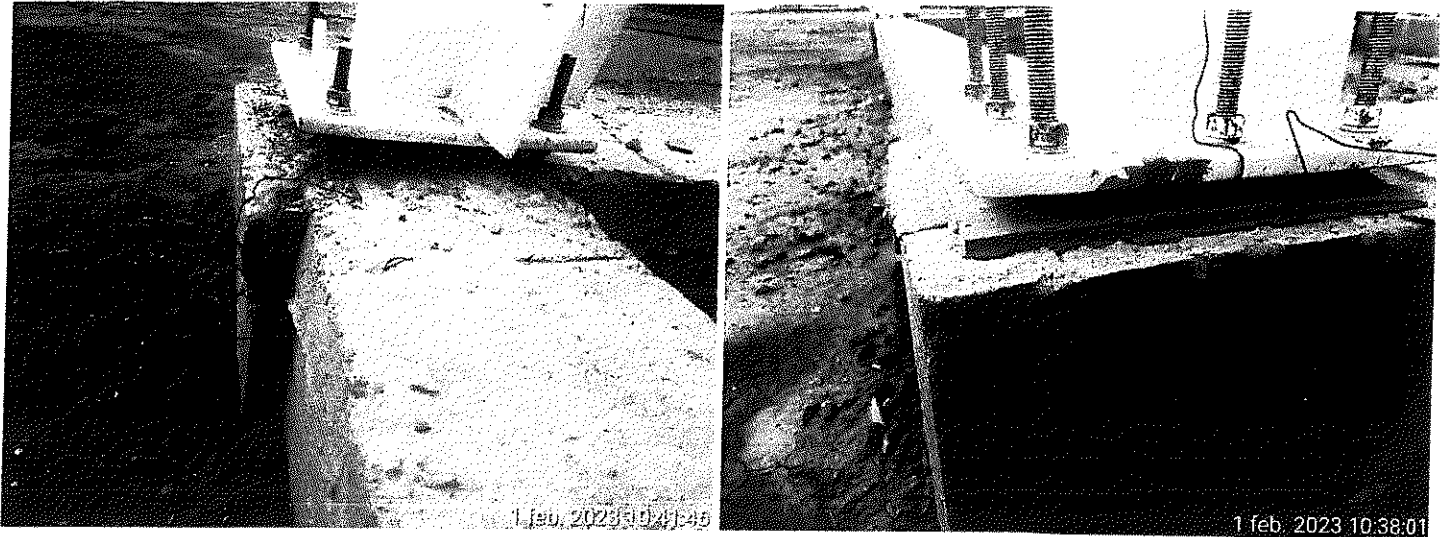

SE APRECIA SEPARACION ENTRE DADOS (ANCLAS DE ACERO) DE CONCRETO Y PLACAS ACERO DE LA ESTRUCTURA. (EN LAS OTRAS DOS SEPARACIONES QUE EXISTIAN ENTRE ANCLAS Y PLACAS SE COLARON).


OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA ATRAVEZADA), MUNICIPIO DE EMPALME"

EJECUTORA: SEDESSON

PROGRAMA DE INVERSIÓN: "FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)"



CONTRATO No.: SEDESSON-FISE-2022-037 (C-00085/0373)



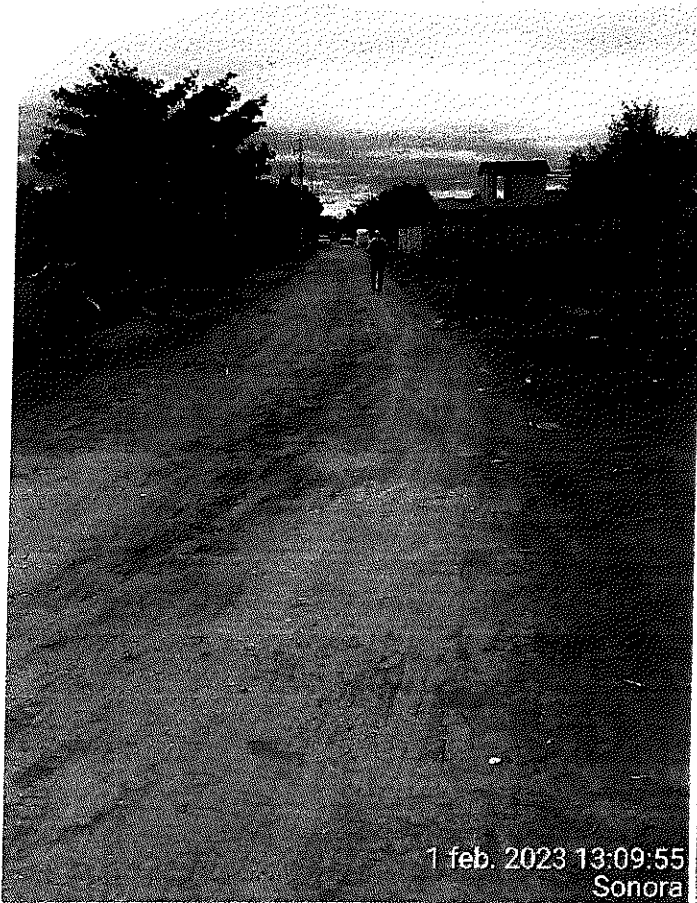

SE APRECIA IMÁGENES POR DONDE PASA LA LINEA DE AGUA POTABLE Y LA COLOCACION DEL COLUMPIO DE LA TOMA DOMICILIARIA, EN EL SECTOR NORPONIENTE Y SUR ORIENTE, EN LA LOC. DE LA ATRAVEZADA.

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD URSULO GALVAN, MUNICIPIO DE EMPALME"
EJECUTORA: SEDESSON
PROGRAMA DE INVERSIÓN: "FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)"
CONTRATO No.: SEDESSON-FISE-2022-037 (C-00085/0375)

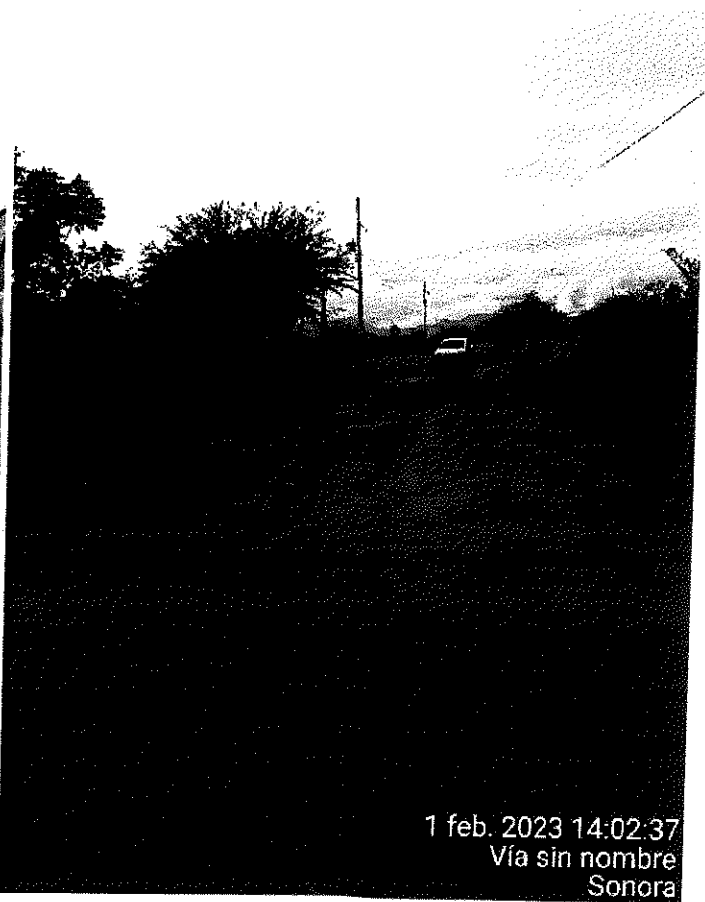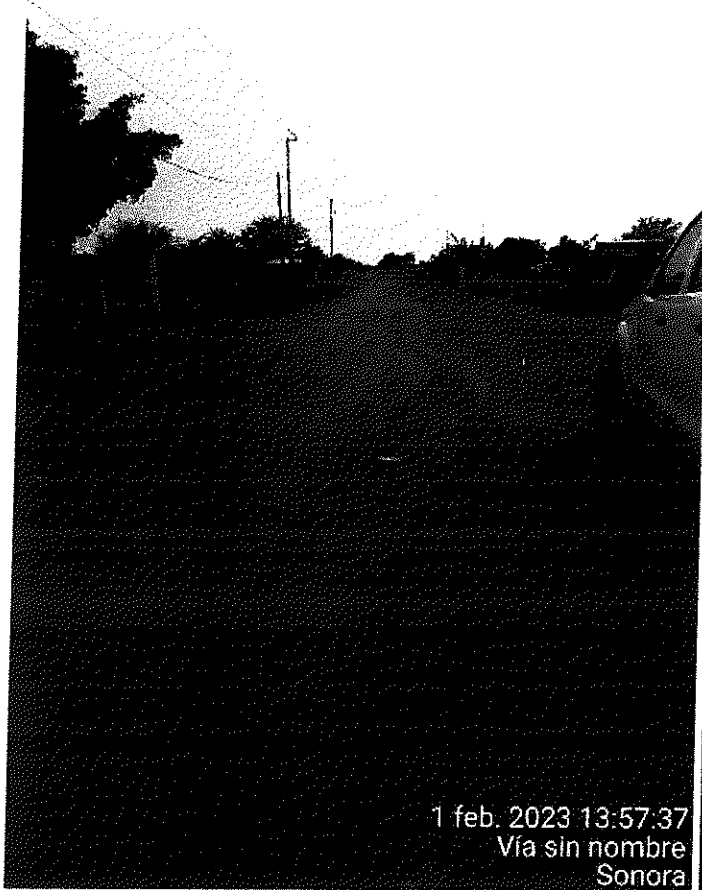


EN LAS IMÁGENES SUPERIORES SE PUEDE APRECIAR, LUGAR POR DONDE SE COLOCO LA LINEA DE AGUA POTABLE, Y EN LAS IMÁGENES INFERIOR, SE OBSERVA LA AUSENCIA DE CUADROS DE TOMA DOMICILIARIA.

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PALMA, MUNICIPIO DE EMPALME"

EJECUTORA: SEDESSON

PROGRAMA DE INVERSIÓN: "FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)"

CONTRATO No.: SEDESSON-FISE-2022-037 (C-00085/0374)

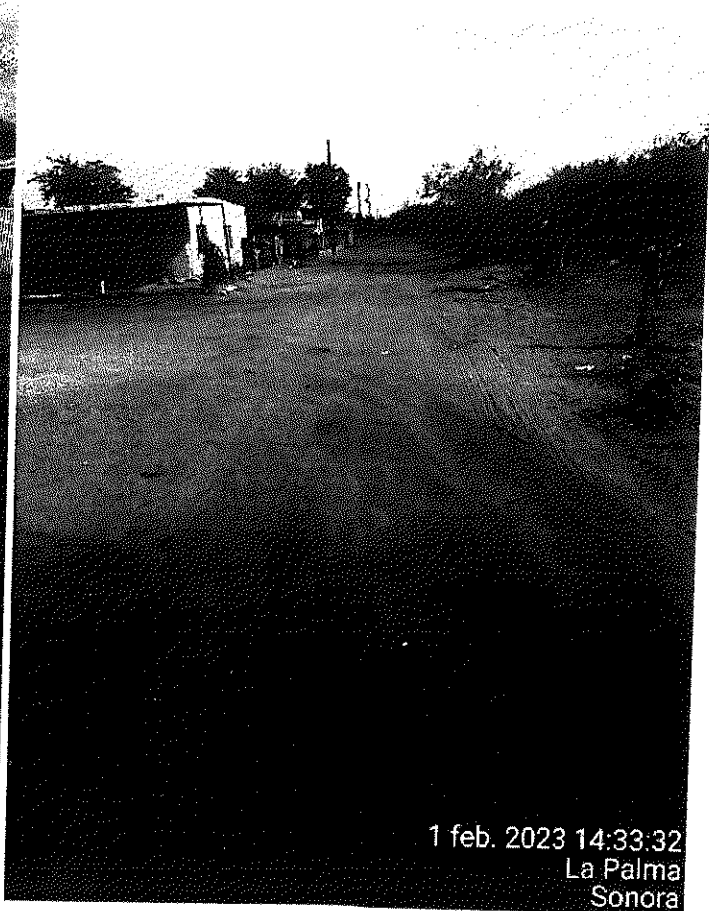





EN LAS IMÁGENES SUPERIORES SE APRECIA EL LUGAR DONDE SE COLOCO LA LINEA DE AGUA POTABLE Y EN LAS FOTOS INFERIORES COLUMPIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS.

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL PAMAR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE EMPALME"

EJECUTORA: SEDESSON

PROGRAMA DE INVERSIÓN: "FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)"

CONTRATO No.: SEDESSON-FISE-2022-037 (C-00085/0376)

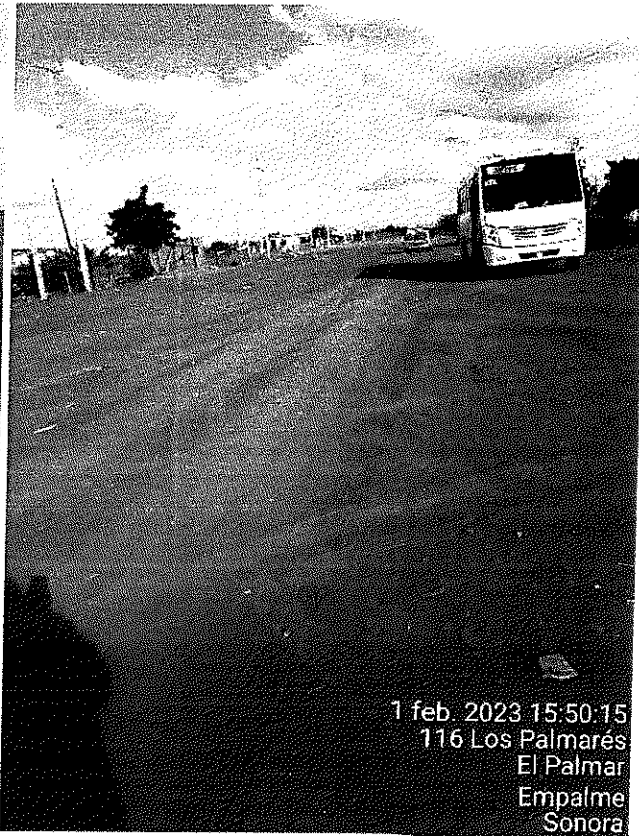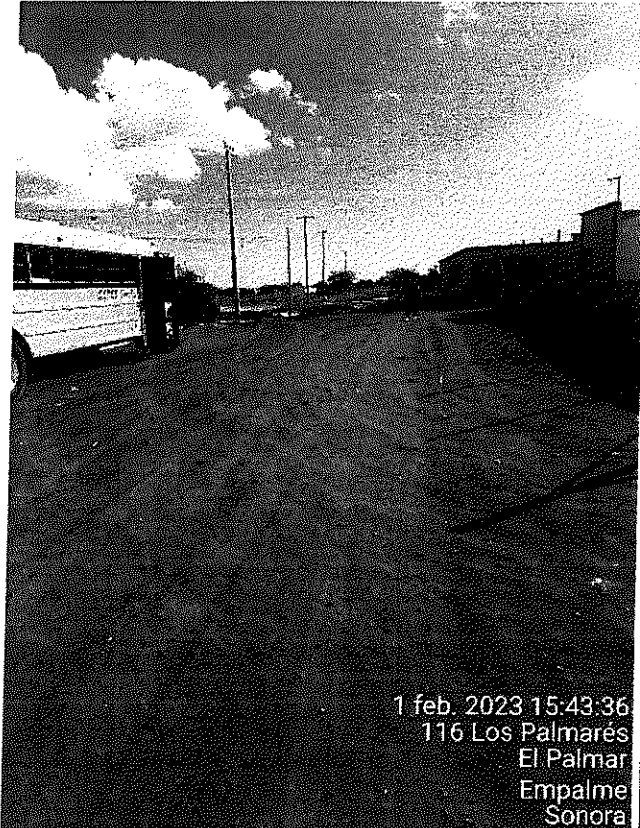



UBICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CUADROS DE MEDICION (COLUMPIOS).


OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO"

EJECUTORA: SEDESSON

PROGRAMA DE INVERSIÓN: "Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)"

CONTRATO No.: SEDESSON-FISE-2022-024 (C-00075/0755)

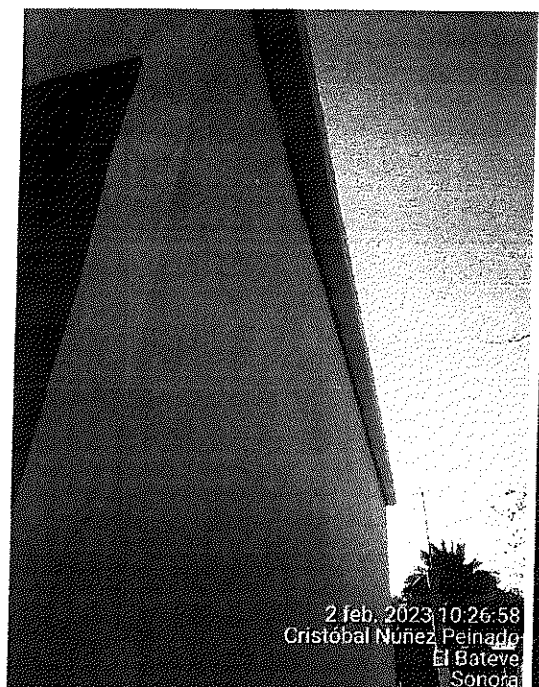


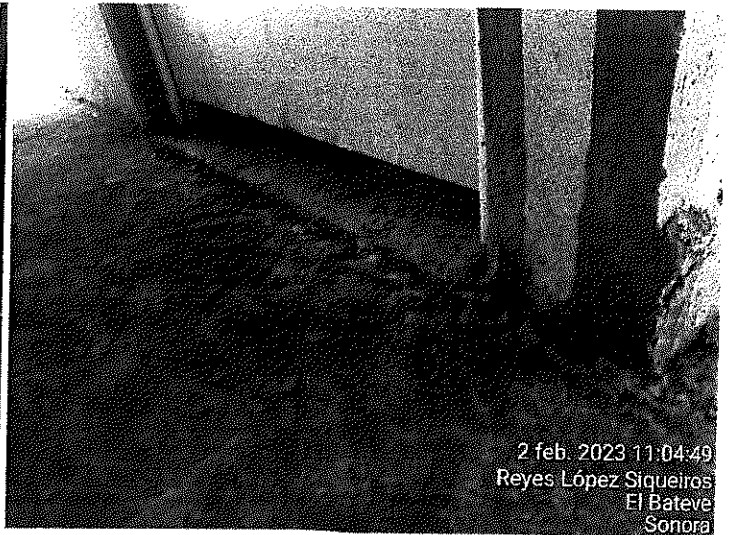



EN ESTAS IMÁGENES FOTOGRAFICAS SE APRECIAN ALGUNOS DETALLES TALES COMO: FALTO DE PINTURA EN MURO, PERFILADO IRREGULAR EN ENJARRE EN MURO EXTERIOR, PARTE INFERIOR, APLICACIÓN DE SELLO EN PUERTAS Y VENTANAS, PUERTA MULTIPANEL PEQUEÑA.

OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ"
EJECUTORA: SEDESSON

PROGRAMA DE INVERSIÓN: "Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)"


CONTRATO No.: SEDESSON-FISE-2022-024 (C-00075/0756)

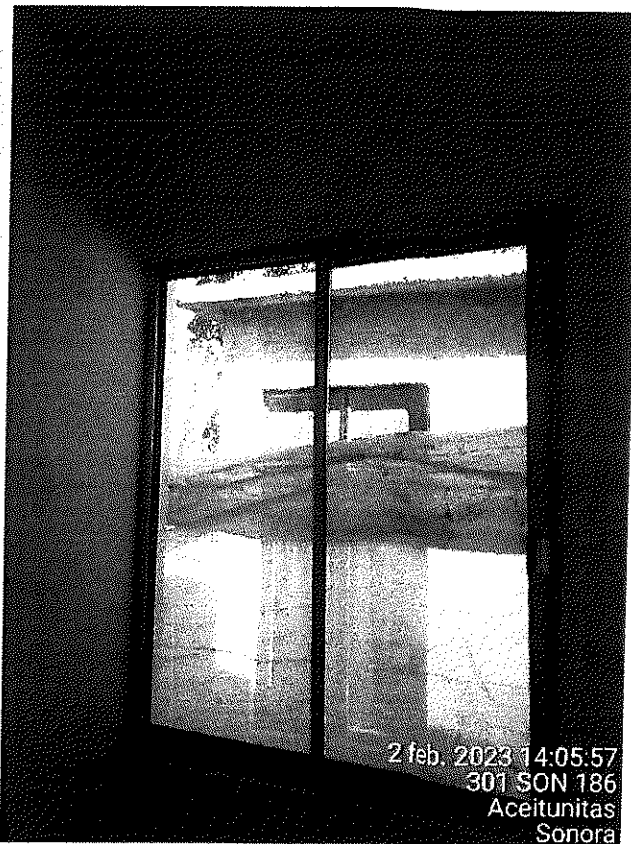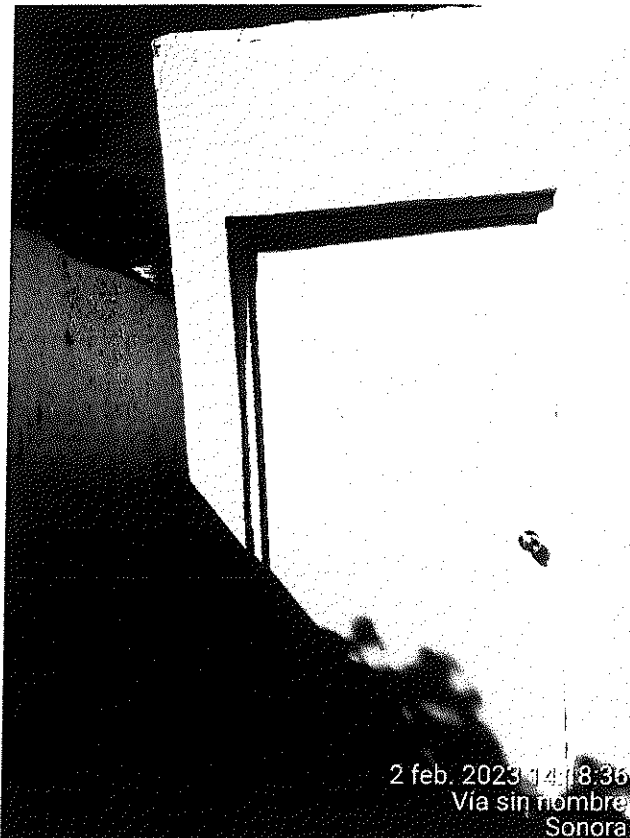


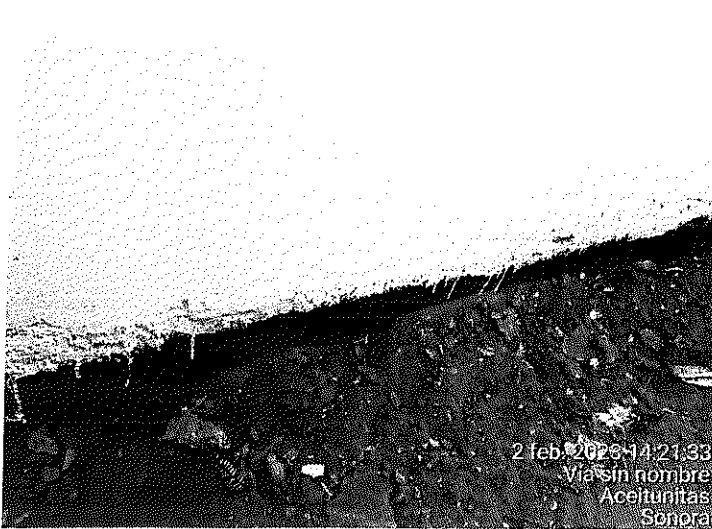

EN ESTAS FOTOS SE APRECIA LO SIGUIENTE: FALTA SELLADO EN PUERTAS Y VENTANAS, PERFILADO IRREGULAR DE ENJARRE, EN MURO EXTERIOR, EN PARTE INFERIOR, REMATE IRREGULAR EN MURO INTERIOR CON LOSA.

OBRA: "CONSTRUCCION DE CUARTO-DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE QUIRIEGO"
EJECUTORA: SEDESSON
PROGRAMA DE INVERSIÓN: "Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)"
CONTRATO No.: SEDESSON-FISE-2022-024 (C-00075/0754)

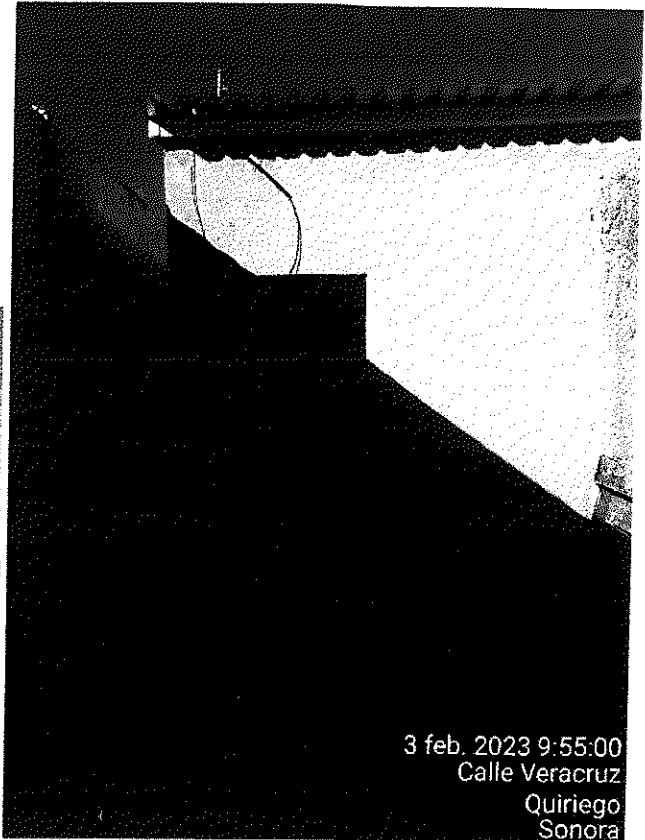

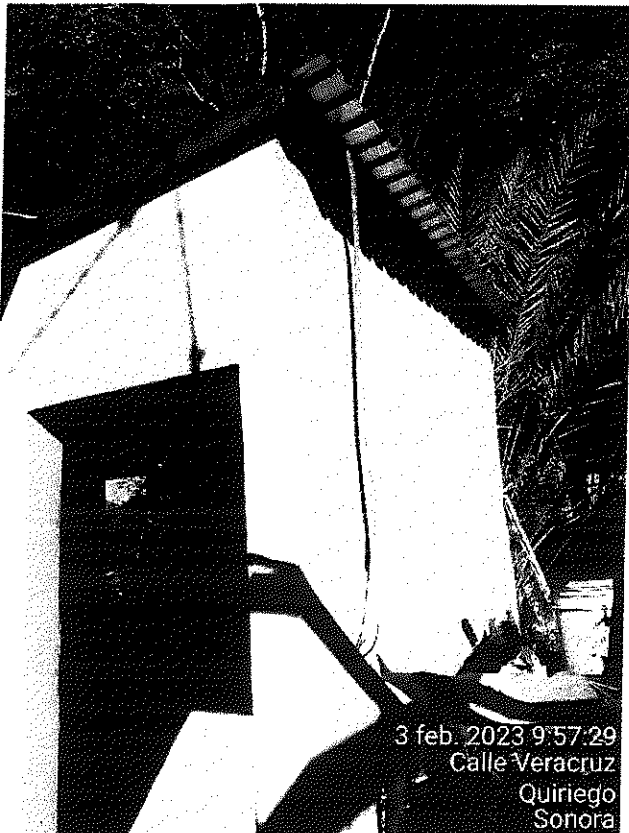

SE APRECIA CUARTO EN MUROS Y ENJARRE, CON TECHUMRE, PINTURA EN MUROS Y SUMINISTRO DE PUERTAS Y VENTANAS

EL DÍA 03 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, HABIÉNDOSE CONCLUIDO LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS, SE REALIZÓ TRASLADO A LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA.

SE ANEXA COPIA DE OFICIO DE COMISIÓN:

ATENTAMENTE



Ing. Anacleto Ignacio Terrones
